



وزارة النقل
الخدمات اللوجستية
Ministry of Transport
and Logistic Services



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية



وزارة النقل
والخدمات اللوجستية
Ministry of Transport
and Logistic Services

مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية



شركة سنا الشرقية للمقاولات





وزارة النقل
الخدمات اللوجستية
Ministry of Transport
and Logistic Service



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

خطة ادارة المشروع



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

مقدمة

يسر شركة سنا الشرقية للمقاولات ان تضع أمامكم خطة تشغيل وصيانة وجودة لمشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية والتي تشمل علي تطبيق لكافة بنود الشروط والمواصفات متلافية كافة السلبات التي عادة ما تظهر خلال فترات التشغيل الأولى وخاصة أثناء مراحل الاحلال وتتعهد الشركة بتكثيف الجهود للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة بكفاءة عالية والعمل علي تطوير الاداء حتي يرقى الي المستوي المنشود .





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

إيضاح هام :

إن الخطة التشغيلية المرفقة لسعادتكم تمثل رؤية عامة للشركة عن كيفية أداء العمالة والمعدات للقيام بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في الشروط والمواصفات ونود ان نلفت انتباه سعادتكم ان ما قدمناه هو عمل يخضع للنقد الجزئي والكامل لكل ما أوردناه ولا يمثل اى التزام على وزارة النقل بأى مما جاء فيه من حيث الاعداد المخصصة للخدمات وتوزيعها على المناطق مع التزامنا الكامل بأى تعديلات بالحذف أو بالاضافة لكافة عناصر المشروع من العمالة والمعدات بما لا يخل بالشروط والمواصفات .


وكما اسلفنا لسعادتكم ما قدمناه جهد بشري لا ندعى كماله أو اكتماله وقد يشوبه القصور ونحتاج دائماً الى توجهاتكم في هذا الشأن مع اعتبار ان هناك تفاصيل أخرى تتسق مع خطة التشغيل المتكاملة وقت الاستلام.





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

الهيكل العام للمشروع

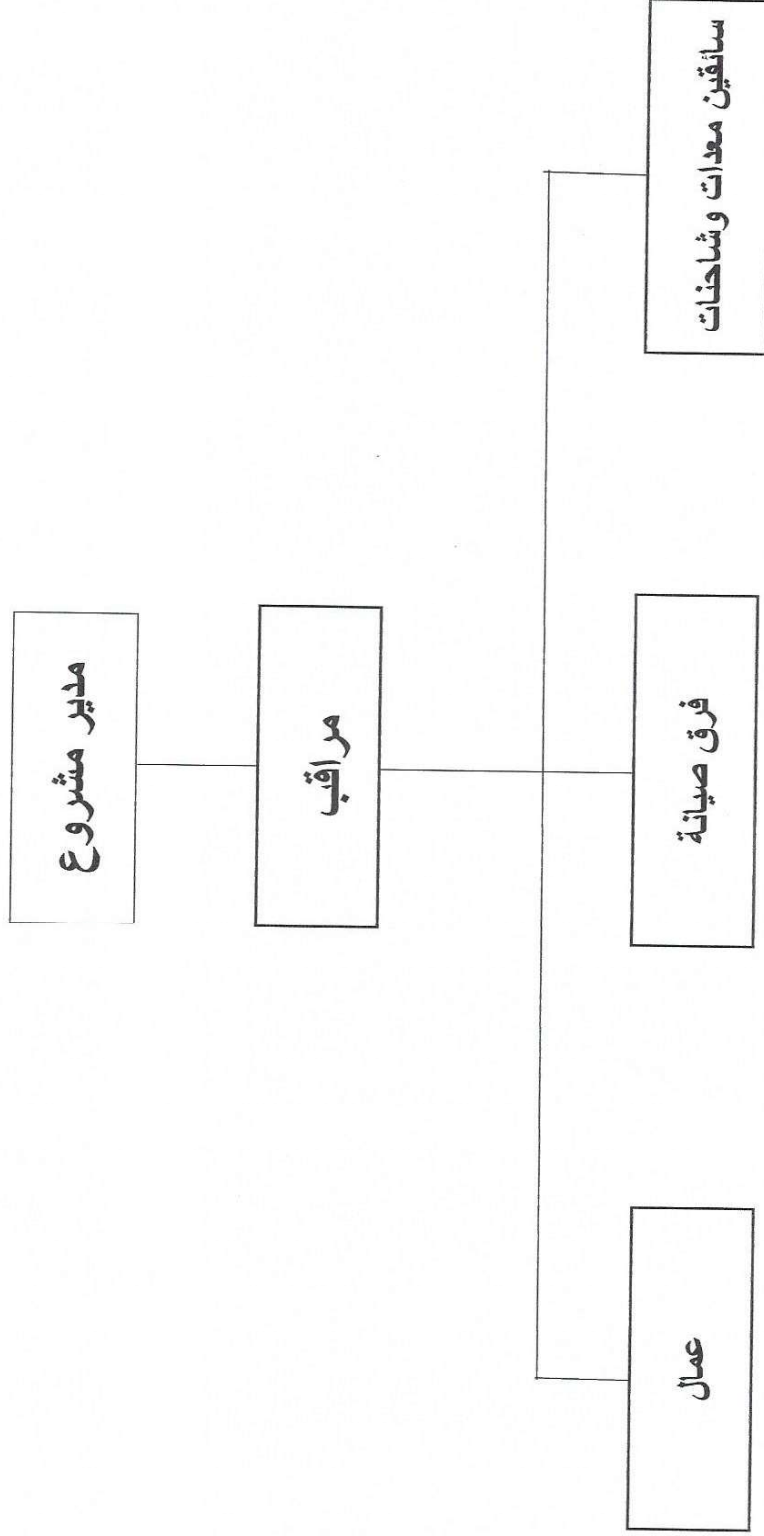



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

الخطة العامة للتشغيل

أسس إعداد خطة التشغيل

تم وضع الخطة التشغيلية بناء على الأسس التالية :-

1. البيانات الإسترشادية والمعدلات المنصوص عليها بالشروط والمواصفات .
2. الدراسات الميدانية وماتج عنها من معدلات وبيانات واقعية .
3. الخبرات السابقة في مجال نظافة وصيانة الطرق .

الهدف من الخطة:

تهدف الخطة إلى تنفيذ التزامات العقد واضعين في الاعتبار النقاط التالية :-

- توضيح الكيفية التي سيتم تنفيذ الالتزامات بموجبها أثناء مرحلة التشغيل لكافة عناصر الخدمات.
- تحديد الأساليب التشغيلية لكل من الخدمات المطلوبه .
- أداء كافة الخدمات والالتزامات المتعلقة بها طبقا للجدول الزمني للمشروع ومستويات الأداء
- توضيح الطريقة والأدوات والمعدات والعمالة المتوفرة لدى المقاول لتنفيذ عملية الصيانة .
- استغلال المعدات الاستغلال الأمثل في تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في العقد .

نتائج الدراسات الميدانية :

اسفرت مرحلة التحضير وما تخللها من دراسات ميدانية وأكاديمية، على العديد من الركائز ، التي تم وضعها موضع الاهتمام والتحليل ، لاختيار انسب الوسائل والامكانيات وفق اساليب تشغيل متطورة قادرة على تنفيذ الأعمال والخدمات المنصوص عليها بالشروط والمواصفات ومستندات





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

العقد من خلال خطة تشغيل توضح الصورة التي سيتم العمل بها خلال مرحلة التنفيذ ، وتفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لمنطقة العقد ، وقد كانت الركائز في إعداد هذه الخطة تعتمد على النتائج التالية:

أولاً : بيانات منطقة العمل (حدود ومشتملات منطقة العقد ، والتقسيمات التشغيلية).

ثانياً : الهياكل التنظيمية والوظيفية القادرة على ادارة الأعمال والخدمات، والدالة علي حجم التنظيم للتأكد من المستوى الجيد للخدمات.

ثالثاً : الجهاز الفني والاداري الخاص بالشركة.

رابعاً : الوسائل والامكانيات اللازمة لتنفيذ كافة الالتزامات التشغيلية.

خامساً : تحديد وتصنيف الاعمال والخدمات والالتزامات المتعلقة بها.



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

التجهيز

1/1 فترة التجهيز:

وهي ما بين توقيع العقد والبدء في تنفيذ المشروع ويتواجد بهذه الفترة كبار المسؤولين, ويعين جهاز فني وإداري وتوزع الأدوار والمسئوليات عليهم, لدراسة جوانب المشروع, حسب شروط ومواصفات العقد لوضع الخطط .

2/1 المكتب الإداري:

سوف يتم تجهيز مكتب إداري وتجهيزه بما يلزم من أثاث وأجهزة وأدوات وتفعيل وسائل التواصل مع مديريه حرس الحدود .

3/1 العمال والسائقين:

العمال والسائقين: سوف يتم إستقدام ما يلزم من عماله وسائقين بعدة تخصصات وتدريبها مع تحديد المسار وتوزيع الأعمال والمهام المكلفين بها حسب الخطة.

4/1 المعدات والآليات:

المعدات والآليات: سوف يتم توفير ما يلزم من المعدات والآليات بأنواعها وأحجامها وذات طراز حديث وتجربتها وتدريب من يقوم بالعمل عليها وتحديد مسارها وتوزيعها حسب الخطة.



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

5/1 الأدوات والمواد المستهلكة:

الأدوات: سوف توفير ما يلزم من أدوات لتففيذ الأعمال.

المواد المستهلكة: سوف يتم توفير ما يلزم من مواد المطلوبة لتففيذ الأعمال.

6/1 الزي الموحد:

الزي الموحد: سوف يتم توفير الزي الموحد للعمال وما يلزم لسلامة.

7/1 سكن العمال:

سكن العمال: سيتم توفير سكن وتجهيزه بالخدمات الأساسية من غرف ومطبخ ومسجد وما يلائم احتياجاتهم.

الخدمات المقدمة لمشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

1/ تنفيذ أعمال الصيانة العادية للطرق الترابية والمرافق التابعة لها موضوع العقد خلال مدة ثلاث (3)

سنوات ميلادية متتالية

2/ تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغ بها المقاول من قبل صاحب العمل خلال سريان العقد

3/ تنفيذ بنود أعمال وسائل السلامة والإصلاح والتجهيزات وأي أعمال طارئة.

4/ توزيع المعدات والعمال على طول مسار الطرق المحددة وبالوضع الذي يمكن من مباشرة أعمال

الصيانة بصورة فعالة

مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

5/ تأمين جميع الأيدي العاملة والمواد والمعدات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة في أماكنها ومواعيدها المحددة بدون تأخير

6/ تسيير دوريات على طول مسار الطريق على مدار الساعة في الحالات الطارئة وفي موسم الأمطار او الأعاصير الترابية.

7/ الاستجابة والتواجد في حالة وجود حدث علي الطريق في المكان المناسب بسرعة لوضع العلامات التحذيرية ومعالجة وإصلاح ذلك حسب الأصول الفنية الهندسية مع تأمين وتسهيل حركة المرور بالوسيلة المناسبة وحسب ما يلزم

8/ عمل الصيانة الدورية لكامل أكتاف الطريق والميول وتنظيف حرم الطريق من الأعشاب والأشجار والمخلفات والكتبان الرملية وإبعادها خارج حرم الطريق مع تهديب الميول بنسبة 6 أفقي 1 : رأسي من نهاية حرم الطريق وللخارج وفق الشروط والمواصفات

9/ الالتزام بالاسعار المقدمة في جدول الكميات

– الخدمات المقدمة من قبل المقاول بشكل مستمر وفوري وتشمل الاتي:

1- أعمال النظافة وتشمل :

1/ نظافة كافة عناصر الطريق من الغبار والاوزاخ و الاتربة والرمال والصخور والنفايات والتي يمكن ان تسبب تشويها للمظهر العام للطريق او عرقلة حركة المرور او التأثير علي سلامة مستخدميه.

2/ ازالة الاعشاب و الاشجار علي او حول أي عنصر من عناصر الطريق

3/ نزع المياه المجتمعة علي مسارات الطريق و المداخل و المخارج من و الي الطريق

5/ نزع المياه المجتمعة علي حرم الطريق

مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

- 6/ تنظيف القطيعات و المنحدرات الجبلية المجاورة للطريق
- 7/ تنظيف وسائل السلامة من الغبار او المواد العالقة بها وأي مواد تلزم لذلك
- 8/ تنظيف الارقام الموجودة علي العبارات و اعادة كتابة الارقام غير الواضحة
- 9/ تنظيف فواصل التمدد في المنزلاقات من الاتربة و المخلفات او المواد المترسبة بداخلها
- 10/ تنظيف قنوات و خنادق التصريف و المزاريب من المخلفات و الاتربة والصخور

2- اعمال الاصلاح و تنقسم الي :

الاسطح الترابية وتشمل :

- 1/ تعبئة الهبوطات في الاكتاف واعادتها الي منسوبها الاصلي
- 2/ ردم الانحرافات التي تحدث بالاكتاف او الميول الترابية او جزاء منها بمواد مناسبة وعلي طبقات لا تزيد سماكة الطبقة عن 20 سم .
- 3/ ردم الانحرافات التي تحدث في حرم الطريق و تسويتها ودكها جيدا .
- 4/ صيانة وتعزيز و ردم الانحرافات التي تحدث في الساتر التراي الامامي .

مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

المشات الخرسانية وتشمل:

- 1/ اصلاح الخرسانة المتكسرة و المتضررة حول مداخل العبارات باستخدام مواد خرسانية مناسبة .
- 2/ ازالة كل ما يؤثر علي سلامة المنشآت الخرسانية وعلي ادائها للعرض التي وجدت من اجله.
- 3/ اصلاح كافة النحورات في جسم الطريق بردمها بمواد مناسبة ودكها علي طبقات لا تزيد سماكتها عن 20 سم .

وسائل السلامة وتشمل :

- 1/ ازالة العناصر التالفة من وسائل السلامة
- 2/ تعديل الاشارات المرورية و الارشادية المائلة بجميع انواعها و شد براغيها او تركيب براغي جديدة لها
- 3/ تعديل الحواجز الخرسانية المائلة او المتحركة عن مكانها و اعادتها الي وضعها الصحيح .

3- اعمال مسح الطرق الترابية وتشمل :

- اعداد برنامج سنوي لمسح كافة طرق العقد ويتم العمل عليه بعد موافقه الجهة المشرفة من بداية العقد ويجدد هذا البرنامج بصورة سنوية يحدد فيه أسماء الطرق التي سيتم مسحها كل شهر .

مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

• نطاق عمل المشروع

- المنطقة الشرقية

وهذا بيان يوضح الطرق بنطاق العمل لفتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية:

م	اسم الطريق	الطول (كم)
1	طريق الطراق	18
2	طريق القرية السفلي	16
3	طريق الرياضيات	29
4	طريق القرو	18.3
5	طريق العطيشانية	65.5
6	طريق الحساء	83
7	طريق الضغط الكهربائي (الجنوبي)	17.8
8	طريق المطار امتداد طريق ام ربيع	44.6
9	طريق مطلة	32.5
10	طريق الحرازية	32.5
11	طريق الوريمة (الظهرة)	13.5
12	طريق ام غوير	7
13	طريق الطراز الغربي	25
14	طريق الاشيعل	9.5



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

15	طريق الشاذلية المتجه من قرية العليا جنوبا لظهرة الحساء	40
16	طريق مورد الخالدية الي مركز ام عقلا	57
17	طريق ام عقلا الي العمانية	14
18	طريق الأبراج الذي يربط طريق الرعية/رماح بطريق النعيرية/جودة	139
19	من مركز مناخ حتي القيصومة	35
20	من مركز ام قليب حتي حفر الباطن	28
21	ربط هجرة البرازيطريق الحفر الباطن/رفحاء (85) وحتى خزان البوشية	15
22	من السعيرة وحتى مفرق ابرق الكبريت	41
23	مزرعة/ محمد إبراهيم القروص	3
24	مزرعة قصي احمد ال موسى	0.7
25	مزرعة علي المغاسلة	10
26	مزرعة حسن الشهري	2.7
27	مزرعة ماضي عسكر الهاجري	0.2
28	طريق الخن يبرين	3.5
29	مزرعة رمضان قاعد العنزي	2.2
30	مزرعة محمد ظافر الشهري	1





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

3	مزرعة اياد محمد الابيض	31
2	مزرعة احمد حامد الغامدي	32
3	مزرعة علي بدر المهاشير	33
15	مزرعة علي محمد المري	34
4.5	مزرعة ناصر عبدالله ال يوسف	35
6.5	مزرعة سعيد عبدالله الغامدي	36
2	مزرعة حسين علي ال الشيخ حسين	37
1.2	مزرعة سلمان احمد براك	38
1.5	مزرعة ناجي راضي ال حرز - مزرعة فهمي سعد الغنام	39
3.8	مزرعة محمد عبدالله الخالدي	40
0.8	مزرعة عبدالعلي عيسي المنشاد	41
2	مزرعة سعود عبدالعزيز الزعبي	42
2.5	مزرعة إبراهيم علي العوامي	43
0.5	مزرعة علي احمد المرهون	44
2.1	مزرعة فهد ناصر الهاجري	45
6	مزرعة فهد راشد الدهان	46
4	مزرعة مريم عبدالله مويس	47
3	مزرعة توفيق حسن فتيل	48





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

49	مجموعة مزارعين/عنهم ابراهيم العماري (المعترض طريق سكة الحديد)	7
50	هجرة محفورة	3
51	مزرعة / سالم عياد المطيري	9
52	مزرعة / دخيل مطلق طامي المطيري	11
53	مزرعة / دغيم عليان ساجر المطيري	9
54	مزرعة / عبد الرحمن عبد الله التركي	7
55	مزرعة / محمد بن بدر الدويش	5
56	مزرعة / فلاح نهار العجمي	7
57	مزرعة / متعب عبيد الميموني المطيري	6
58	مزرعة / راشد حمد محمد المري	3
59	مزرعة / محمد بغير جابر المري	3
60	هجرة / ذعبلوتن محمد صالح الراشدي	500
61	مزرعة / عبد الله فهد عبد الله المري	20
62	مزرعة / فؤاد عيسى الدوسري	0.5
63	مزرعة / صالح مسفر ال حيدر	3
64	مزرعة / محمد احمد ابو قرصين	0.5
65	مزرعة / وليد فهد عبد الله اباحسين	1





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

66	مزرعة / بدر عبد الله السهلي	1.2
67	مزرعة / عبد الله حبيب ال عيد	2.5
68	مزرعة / منصور جمعان الزهراني	3.2
69	مزرعة / مهدي عباس احمد	0.7
70	مزرعة / صابر محمد ال غرامة الوكيل / سعيد محمد عبد الله الدخيل	1
71	مزرعة / مني علي حسين العشوي	2.6
72	مزرعة / حسين عبد الجليل ال حمزة	5.2
73	مزرعة / جار الله محمد الزهراني	2.3
74	مزرعة / عمر غالب الدرويش	3
75	مزرعة / رامي احمد كمال الوكيل / عبد الرحيم عبد الكريم ال احمد	2
76	مزرعة / حبيب محمد الرمضان	6
77	مزارع / شمة راشد الدوسري ومبارك راشد الدوسري ومحمد مرشد الدوسري	0.6
78	مزرعة / عادل عبد الله ال هندر	4
79	مزرعة / محمد عبد الله المطيري	17
80	مزارع غرب المطار / الوكيل عن المزارعين ماجد سعيد الشاخوري	4





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

1	مزرعة / عبد الله صالح الدرويش	81
0.7	مزرعة / خالد ابراهيم العجلان الوكيل / عبد السلام باقر المطاوعة	82
0.75	مزرعة حسين عبدالله الشخل	83
1.5	مزرعة ابراهيم سلامة الحربي	84
1.2	مزرعة محمد مغرم علي الغامدي	85
0.4	مزرعة فوزية سليمان المحيسن الوكيل / خالد سند الدوسري	86
1.5	مزرعة ثامر منصور المطرودي	87
9.5	مزرعة عبدالله ماجد الدويش	88
0.5	مبارك احمد الصافي الغامدي	89
7.5	مزرعة فرحان فالح الزعبي	90
1	مزرعة معجب حمود العتيبي	91
0.8	مزرعة فهد ناصر الجاسم الرويحي	92
1.6	مزرعة صباح عبدالعزيز الزامل	93
1.6	مزرعة جميل صالح ال زريع	94
2.3	مزرعة محمد صالح المري	95
2	مزرعة حمد ابراهيم الخلف	96
0.7	مزرعة ترك محمد صالح الملاخ الوكيل / محمد عبد الله الحسن	97





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

5	مزرعة مرعي حيدر مرعي القحطاني	98
0.5	مزرعة محمد عبدالله ال حماد	99
9	مزرعة صالح محمد حمد المري	100
1	مزرعة الأميرة / مشاعل بنت فهد بن جلوي ال سعود	101
0.6	مزرعة صادق عبد رب الرضا	102
0.8	مزرعة معيض سعيد القحطاني	103
1.7	مزرعة علي محمد حمدان العمري	104
1.6	مزرعة عمران علي عبدالله ال سعيد	105
5	مزرعة عبدالله غنام الخالدي	106
1.5	مزرعة نايف محمد الخالدي وماجد ناصر العاصمي	107
25	أهالي مركز مشدوبة (تركي بن غزاي صمير)	108
0.3	مزرعة محمد منصور الدوسري	109
25	مزرعة سلطان شايح سعود الضويحي	110
1.3	مزرعة خالد فهد مبارك الدوسري	111
0.5	مزرعة فؤاد عيسي جاسم الدوسري	112
4	مجموعة مزارعين/ عنهم سعد ماجد السديري	113
5	بدر عبدالله رذن السهلي . مجموعة مزارعين عنهم مهدي عباس احمد الطريق الرابط بين M و M2 (طريق القتالة)	114





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

0.3	خليفة محمد الشايب و محمد صالح العواد	115
5	مزرعة رجاء صالح بالحارث	116
1	مزرعة احمد علي الخلف . عنه الوكيل / عبدالله مهدي ال فردان	117
1.5	مزرعة سالم عايض منير العتيبي	118
3	سعود عبدالرحيم الفرج ، شاكر علي الفرج ، ناصر حسن الجاروف	119
2.5	مزرعة منذر يوسف الغزال	120
15	طريق الشملول القديم بجانب الناصرية	121
6	علياء احمد محمد الدوسري ، الوكيل محمد حمد العماري	122
1.7	خليفة محمد الدوسري ، الوكيل / خالد خليفة الدوسري	123
2.5	محمد القحطاني	124
7	فهد سعد المطيري	125
3	علوش ناصر العجمي	126
0.7	نمر بن خالد الراشد	127
10	فهد بن سعود بن جفين العجمي	128
0.5	خالد سعيد خميس الدوسري ، الوكيل خالد خليفة الدوسري	129
2.5	مجموعة مزارعين / عنهم احمد عوض القحطاني	130
2.6	ناصر عبد الله النمشان	131





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

30	وصلة طريق ام قليب - حفر الباطن	132
8	وصلة طريق مركز الفاو - الذبيبة	133
8.7	الطريق 1 بمركز مليحة	134
0.7	الطريق 2 بمركز مليحة	135
2.8	الطريق 3 بمركز مليحة	136
2.8	الطريق 4 بمركز مليحة	137
2.95	الطريق 5 بمركز مليحة	138
4.85	الطريق 6 بمركز مليحة	139
1.2	الطريق 7 بمركز مليحة	140
3.2	الطريق 8 بمركز مليحة	141
3.2	الطريق 9 بمركز مليحة	142
2.4	الطريق 10 بمركز مليحة	143
2.1	الطريق 11 بمركز مليحة	144
1	الطريق 12 بمركز مليحة	145
2	الطريق 13 بمركز مليحة	146
2.5	طريق مزرعة جلوي بن ناصر العجمي	147
1.8	طريق مزرعة محمد احمد المسيعيد	148
3.1	طريق مزرعة مطلق بن عبدالله الدويش	149





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

13	طريق مزرعة نشا عايش فضاء البقمي	150
1.5	نذير عبدالواحد الحيدر	151
3.5	علي سالم ال موسي	152
3.4	سعد ابراهيم العبد القادر	153
1.5	رباح سعيد ال ضاحي	154
3	عبد الجليل احمد ال حمزة	155
1.6	حسين عبد الحميد المرهون	156
1	الهام حسن الصغير	157
2	ناصر عبدالله الدوسري	158
1.5	داوود سليمان المبيض	159
1.2	سلطان علوش السهلي	160
4	عبد الرحمن المعيصب	161
2	ماجد ناصر الهاجري	162
1.5	براك سلطان الخالدي	163
1	مرتضي ال مرهون ومحمد وهب العلي	164
1.5	قاسم ابراهيم الشقاق	165
0.5	حجي حسين الجبران	166
1	صالح معتوق ال محمد علي	167





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

0.7	عبدالله معتوق القديحي	168
5	محمد ناصر بن شافي	169
16	نايف مدرهم الكثيري	170
1.8	محمد احمد المسعيد	171
3.1	مطلق عبدالله الدويش	172
1.3	طريق هجرة السفانية	173
1.2	عبدالله عيسي	174
3.5	خليفة الدوسري	175
3	علوي بن صالح ال كاظم	176
0.5	احمد علي عبدالله ال خلف	177
3.5	يوسف محسن احبيل	178
4	عبدالرزاق عبدالرحمن المعصب	179
4	عادل مقبل الذكر	180
2	عبدالرحمن عبدالله الرميزان	181
1.5	ابوسالم اليامي	182
1.5	خالد الخميس	183
1	عبدالله الماجد	184
11	ماجد سعيد الشاخوري	185





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

3.6	عبد الله عبد الوهاب عبداللطيف الصالح	186
2.5	احمد يحيى الحكمي	187
2	خالد الزهراني	188
4	سمير حمد الرشيد	189
2.5	هند عدنان الزبيدي	190
1.5	عبداللطيف صالح الحمد	191
0.5	نايف لاهم الخالدي	192
1	فيصل احمد المنصور	193
1.5	احمد محمد الغامدي	194
2	جاسم محمد زاهري	195
0.8	عبد الجليل حمزة ال عاشور	196
0.8	علي تركي ال هلال	197
1	عبد المنعم تركي ال هلال	198
0.5	جعفر اسماعيل ال منصور	199
1	جاسم علي الثواب	200
0.5	محمد علي الثواب	201
0.5	حسين علي الثواب	202
1	علي جعفر ال فردان	203





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

1.3	نادر عبد الواحد الحيدر	204
2	جبر يوسف الرميحي	205
1	عبد الرزاق عبدالله عبدالرحمن الدليجان	206
5	علي بن عايض العجمي	207
0.8	عبدالله ابراهيم الهلالي	208
5	عباس علي القروص	209
2	يحيى حكيم وكيل عنه عبدالله عصيص	210
2	عبدالله علي عبدالله الحنيزي	211
1.5	علي عبدالله علي الحنيزي	212
1.2	علي سالم الغامدي	213
1.5	خالد علي ال جبر	214
1	علي محمد العمري 2	215
5	حبيب علي القروص	216
2	زهراء عبدالكريم ال غريب	217
1.5	مرعي حيدر ال دواس القحطاني	218
1.2	حسين محمد الهبوب	219
1	مانع ناصر المانع	220
2	عمران السعدي	221



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

0.2	حسين عيسى ال امان	222
0.5	سعد مسمار القحطاني	223
0.7	احمد محمد العليوي	224
0.5	علي حسين ال امان	225
2	قاسم الشقاق	226
2	مرتضي الجميعان	227
2	محمد نايف	228
2	صلاح حمد الرشيد	229
2.5	هويج حسن القحطاني	230
1	محمد نايف 2	231
0.5	عبدالله حبيب العيد	232
1.2	ماجد ناصر القحطاني	233
2	يوسف احمد العثمان	234
0.5	محمد حمود السهدي الهاجري	235
2.5	سليمان حمد علي الحمد	236
2	ابراهيم حمد علي الحمد	237
2.5	سالم عبدالله علي البلم	238
20	طريق القرارين	239





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

3.7	طريق الشهامة	240
1.5	طريق هجرة الذيايبة	241
100	طريق هجرة عجائب	242
0.7	محمد علي النمر	243
0.5	سعيد رداد الزهراني	244
0.25	خالد مبارك القحطاني	245
1	خريفة سعيد الطبعي	246
1	مرتضي عبد الحميد المرهون	247
1	محمد بن وهب مك العالي	248
2.5	سعيد حبيب المغاسلة	249
2.5	مني سعيد القرني	250
1.5	سعيد سلمان المهدي ورفقاه	251
2.5	عبدالرحمن المعيصب	252
0.9	صالح علي المري	253
0.5	محمد سعيد القسم	254
1	طاهر ابراهيم الهاشم	255
3	خالد خليفة الدوسري	256
0.4	شيخة سعد ال حسين	257





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

7	ماجد ناصر الهاجري ورقفاه	258
7.5	مجموعة مزارعين / عنهم / احمد عوض القحطاني	259
1	منصور محمد حيان	260
2	عبدالله حمد العايزي	261
150	أهالي هجرة عردة / عنهم : غانم سعد العقاري	262
14.8	طريق أهالي مركز الحرياء	263
3	سفر مبارك الشهري	264
1.5	داهم بتال القحطاني	265
3	محمد حمود الهاجري	266
3	خالد إبراهيم الفلاج	267
2324	مجموع الاطوال (كم)	

حدود الموقع :

مسارات الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية .



خريطة المنطقة الشرقية:



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

• ملخص الأصول:

الطرق تحت الصيانة	
مفردة	2324 كم

• نطاق العمل

لتحقيق اهداف الصيانة العادية بالمحافظة على الأصول بحالة تشغيلية جيدة في جميع الأوقات ومنع تدهور الأصول تم تقسيم العقد الى (11 فرقة) وتم توزيع معدات الصيانة العادية عليها كما في الجدول التالي :

م	اسم الطريق	الفرق	الطول (كم)
1	طريق الطراق	الفرقة الاولى	229.8
2	طريق القرية السفلي		
3	طريق الرياضيات		
4	طريق القرو		
5	طريق العطيشانية		



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

		طريق الحساء	6
222.4	الفرقة رقم (2)	طريق الضغط الكهربائي (الجنوبي)	7
		طريق المطار امتداد طريق ام ربيع	8
		طريق مطلة	9
		طريق الحرازية	10
		طريق الوريمة (الظهرة)	11
		طريق ام غوير	12
		طريق الطراز الغربي	13
		طريق الاشيعل	14
		طريق الشاذلية المتجه من قرية العليا جنوبا لظهرة الحساء	15
210	الفرقة رقم (3)	طريق مورد الخالدية الي مركز ام عقلا	16
		طريق ام عقلا الي العمانية	17
		طريق الأبراج الذي يربط طريق الرعية/ارماح بطريق النعيرية/جودة	18
212.7	الفرقة	من مركز مناخ حتي القيصومة	19
	رقم (4)	من مركز ام قليب حتي حفر الباطن	20



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

21	ربط هجرة البرازيطريق الحفر الباطن/ارفحاء (85) وحتى خزان البوشية
22	من السعيرة وحتى مفرق ابرق الكبريت
23	مزرعة/ محمد إبراهيم القروص
24	مزرعة قصي احمد ال مويس
25	مزرعة علي المغاسلة
26	مزرعة حسن الشهري
27	مزرعة ماضي عسكر الهاجري
28	طريق الخن يبرين
29	مزرعة رمضان قاعد العنزي
30	مزرعة محمد ظافر الشهري
31	مزرعة اياد محمد الابيض
32	مزرعة احمد حامد الغامدي
33	مزرعة علي بدر المهاشير
34	مزرعة علي محمد المري
35	مزرعة ناصر عبدالله ال يوسف
36	مزرعة سعيد عبدالله الغامدي
37	مزرعة حسين علي ال الشيخ حسين



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

		مزرعة سلمان احمد براك	38
		مزرعة ناجي راضي ال حرز - مزرعة فهمي سعد الغنام	39
		مزرعة محمد عبدالله الخالدي	40
		مزرعة عبدالعلي عيسي المنشاد	41
		مزرعة سعود عبدالعزيز الزعبي	42
		مزرعة إبراهيم علي العوامي	43
		مزرعة علي احمد المرهون	44
		مزرعة فهد ناصر الهاجري	45
		مزرعة فهد راشد الدهان	46
		مزرعة مريم عبدالله مويس	47
		مزرعة توفيق حسن فتيل	48
		مجموعة مزارعين/ عنهم ابراهيم العماري (المعترض طريق سكة الحديد)	49
63	الفرقة رقم (5)	هجرة محفورة	50
		مزرعة / سالم عياد المطيري	51
		مزرعة / دخيل مطلق طامي المطيري	52
		مزرعة / دغيم عليان ساجر المطيري	53
		مزرعة / عبد الرحمن عبد الله التركي	54





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

		مزرعة / محمد بن بدر الدويش	55
		مزرعة / فلاح نهار العجمي	56
		مزرعة / متعب عبيد الميموني المطيري	57
		مزرعة / راشد حمد محمد المري	58
		مزرعة / محمد بعير جابر المري	59
250	الفرقة رقم (10)	هجرة / ذعلوتن محمد صالح الراشدي	60
250	الفرقة رقم (11)	هجرة / ذعلوتن محمد صالح الراشدي	60
166.55	تكملة الفرقة رقم (5)	مزرعة / عبد الله فهد عبد الله المري	61
		مزرعة / فؤاد عيسى الدوسري	62
		مزرعة / صالح مسفر ال حيدر	63
		مزرعة / محمد احمد ابو قرصين	64
		مزرعة / وليد فهد عبد الله اباحسين	65
		مزرعة / بدر عبد الله السهلي	66
		مزرعة / عبد الله حبيب ال عيد	67
		مزرعة / منصور جمعان الزهراني	68
		مزرعة / مهدي عباس احمد	69





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

70	مزرعة / صابر محمد ال غرامة الوكيل / سعيد محمد عبد الله الدخيل
71	مزرعة / مني علي حسين العشوي
72	مزرعة / حسين عبد الجليل ال حمزة
73	مزرعة / جار الله محمد الزهراني
74	مزرعة / عمر غالب الدرويش
75	مزرعة / رامي احمد كمال الوكيل / عبد الرحيم عبد الكريم ال احمد
76	مزرعة / حبيب محمد الرمضان
77	مزارع / شمة راشد الدوسري ومبارك راشد الدوسري ومحمد مرشد الدوسري
78	مزرعة / عادل عبد الله ال هندر
79	مزرعة / محمد عبد الله المطيري
80	مزارع غرب المطار / الوكيل عن المزارعين ماجد سعيد الشاخوري
81	مزرعة / عبد الله صالح الدرويش
82	مزرعة / خالد ابراهيم العجلان الوكيل / عبد السلام باقر المطاوعة





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

83	مزرعة حسين عبدالله الشخل
84	مزرعة ابراهيم سلامة الحربي
85	مزرعة محمد مغرم علي الغامدي
86	مزرعة فوزية سليمان المحيسن الوكيل / خالد سند الدوسري
87	مزرعة ثامر منصور المطرودي
88	مزرعة عبدالله ماجد الدويش
89	مبارك احمد الصافي الغامدي
90	مزرعة فرحان فالح الزعبي
91	مزرعة معجب حمود العتيبي
92	مزرعة فهد ناصر الجاسم الرويحي
93	مزرعة صباح عبدالعزيز الزامل
94	مزرعة جميل صالح ال زريع
95	مزرعة محمد صالح المري
96	مزرعة حمد ابراهيم الخلف
97	مزرعة ترك محمد صالح الملافخ الوكيل / حسن عبدالله الحسن
98	مزرعة مرعي حيدر مرعي القحطاني





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

		99	مزرعة محمد عبدالله ال حماد
		100	مزرعة صالح محمد حمد المري
		101	مزرعة الأميرة / مشاعل بنت فهد بن جلوي ال سعود
		102	مزرعة صادق عبد رب الرضا
		103	مزرعة معيض سعيد القحطاني
		104	مزرعة علي محمد حمدان العمري
		105	مزرعة عمران علي عبدالله ال سعيد
		106	مزرعة عبدالله غنام الخالدي
		107	مزرعة نايف محمد الخالدي وماجد ناصر العاصمي
		108	أهالي مركز مشذوبة (تركي بن غزاي صمير)
221.4	الفرقة رقم (6)	109	مزرعة محمد منصور الدوسري
		110	مزرعة سلطان شايح سعود الضويحي
		111	مزرعة خالد فهد مبارك الدوسري
		112	مزرعة فؤاد عيسي جاسم الدوسري
		113	مجموعة مزارعين/ عنهم سعد ماجد السديري
		114	بدر عبدالله رذن السهلي . مجموعة مزارعين عنهم مهدي عباس احمد الطريق الرابط بين M و M2(طريق البقالة)





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

115	خليفة محمد الشايب و محمد صالح العواد
116	مزرعة رجاء صالح بالحارث
117	مزرعة احمد علي الخلف . عنه الوكيل / عبدالله مهدي ال فردان
118	مزرعة سالم عايض منير العتيبي
119	سعود عبدالرحيم الفرج ، شاكرا علي الفرج ، ناصر حسن الجاروف
120	مزرعة منذر يوسف الغزال
121	طريق الشملول القديم بجانب الناصرية
122	علياء احمد محمد الدوسري ، الوكيل محمد حمد العماري
123	خليفة محمد الدوسري ، الوكيل / خالد خليفة الدوسري
124	محمد القحطاني
125	فهد سعد المطيري
126	علوش ناصر العجمي
127	نمر بن خالد الراشد
128	فهد بن سعود بن جفين العجمي
129	خالد سعيد خميس الدوسري ، الوكيل خالد خليفة الدوسري





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

130	مجموعة مزارعين / عنهم احمد عوض القحطاني
131	ناصر عبد الله النمشان
132	وصلة طريق ام قليب - حفر الباطن
133	وصلة طريق مركز الفاو - الذبيبة
134	الطريق 1 بمركز مليحة
135	الطريق 2 بمركز مليحة
136	الطريق 3 بمركز مليحة
137	الطريق 4 بمركز مليحة
138	الطريق 5 بمركز مليحة
139	الطريق 6 بمركز مليحة
140	الطريق 7 بمركز مليحة
141	الطريق 8 بمركز مليحة
142	الطريق 9 بمركز مليحة
143	الطريق 10 بمركز مليحة
144	الطريق 11 بمركز مليحة
145	الطريق 12 بمركز مليحة
146	الطريق 13 بمركز مليحة
147	طريق مزرعة جلوي بن ناصر العجمي



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

		طريق مزرعة محمد احمد المسيعيد	148
		طريق مزرعة مطلق بن عبدالله الدويش	149
		طريق مزرعة نشا عايش فضاء البقمي	150
		نذير عبدالواحد الحيدر	151
		علي سالم ال موسي	152
		سعد ابراهيم العبد القادر	153
		رباح سعيد ال ضاحي	154
		عبد الجليل احمد ال حمزة	155
		حسين عبد الحميد المرهون	156
		الهام حسن الصغير	157
		ناصر عبدالله الدوسري	158
		داوود سليمان المبيض	159
		سلطان علوش السهلي	160
		عبد الرحمن المعيصب	161
184.6	الفرقة رقم (7)	ماجد ناصر الهاجري	162
		براك سلطان الخالدي	163
		مرتضي ال مرهون ومحمد وهب العلي	164
		قاسم ابراهيم الشقاق	165





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

166	حجي حسين الجبران
167	صالح معتوق ال محمد علي
168	عبدالله معتوق القديحي
169	محمد ناصر بن شافي
170	نايف مدرهم الكثيري
171	محمد احمد المسعيد
172	مطلق عبدالله الدويش
173	طريق هجرة السفانية
174	عبدالله عيسي
175	خليفة الدوسري
176	علوي بن صالح ال كاظم
177	احمد علي عبدالله ال خلف
178	يوسف محسن احبيل
179	عبدالرزاق عبدالرحمن المعيصب
180	عادل مقبل الذكير
181	عبدالرحمن عبدالله الرميزان
182	ابوسالم اليامي
183	خالد الخميس





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

	عبدالله الماجد	184
	ماجد سعيد الشاخوري	185
	عبد الله عبد الوهاب عبداللطيف الصالح	186
	احمد يحيى الحكمي	187
	خالد الزهراني	188
	سمير حمد الرشيد	189
	هند عدنان الزبيدي	190
	عبداللطيف صالح الحمد	191
	نايف لاحم الخالدي	192
	فيصل احمد المنصور	193
	احمد محمد الغامدي	194
	جاسم محمد زاهري	195
	عبد الجليل حمزة ال عاشور	196
	علي تركي ال هلال	197
	عبدالمنعم تركي ال هلال	198
	جعفر اسماعيل ال منصور	199
	جاسم علي الثواب	200
	محمد علي الثواب	201





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

202	حسين علي الثواب
203	علي جعفر ال فردان
204	نادر عبد الواحد الحيدر
205	جبر يوسف الرميحي
206	عبد الرزاق عبدالله عبدالرحمن الدليجان
207	علي بن عايض العجمي
208	عبدالله ابراهيم الهلالي
209	عباس علي القروص
210	يحيى حكيم وكيل عنه عبدالله عصيص
211	عبدالله علي عبدالله الخنيزي
212	علي عبدالله علي الخنيزي
213	علي سالم الغامدي
214	خالد علي ال جبر
215	علي محمد العمري 2
216	حبيب علي القروص
217	زهراء عبدالكريم ال غريب
218	مرعي حيدر ال دواس القحطاني
219	حسين محمد الهبوب





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

220	مانع ناصر المانع
221	عمران السعدي
222	حسين عيسي ال امان
223	سعد مسمار القحطاني
224	احمد محمد العليوي
225	علي حسين ال امان
226	قاسم الشقاق
227	مرتضي الجميعان
228	محمد نايف
229	صلاح حمد الرشيد
230	هويج حسن القحطاني
231	محمد نايف 2
232	عبدالله حبيب العيد
233	ماجد ناصر القحطاني
234	يوسف احمد العثمان
235	محمد حمود السهدي الهاجري
236	سليمان حمد علي الحمد
237	ابراهيم حمد علي الحمد





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

		سالم عبدالله علي البلم	238
		طريق القراين	239
		طريق الشهامة	240
138.25	الفرقة رقم (8)	طريق هجرة الذيايبة	241
		طريق هجرة عجائب	242
		محمد علي النمر	243
		سعيد رداد الزهراني	244
		خالد مبارك القحطاني	245
		خريفة سعيد الطبعي	246
		مرتضي عبد الحميد المرهون	247
		محمد بن وهب مك العالي	248
		سعيد حبيب المغاسلة	249
		مني سعيد القرني	250
		سعيد سلمان المهدي ورفقاه	251
		عبدالرحمن المعيصب	252
		صالح علي المري	253
		محمد سعيد القسيم	254
		طاهر ابراهيم الهاشم	255





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

		خالد خليفة الدوسري	256
		شيخة سعد ال حسين	257
		ماجد ناصر الهاجري ورفقاه	258
		مجموعة مزارعين / عنهم / احمد عوض القحطاني	259
		منصور محمد حيان	260
		عبدالله حمد العايزي	261
175.3	الفرقة رقم (9)	أهالي هجرة عردة / عنهم : غانم سعد العقاري	262
		طريق أهالي مركز الحرياء	263
		سفر مبارك الشهري	264
		داهم بتال القحطاني	265
		محمد حمود الهاجري	266
		خالد إبراهيم الفلاج	267





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

خطة إدارة الموارد والطاخم الفني:

يتم تشكيل 11 فرقة وتكون الفرق كالتالي :

- 7 فرق مكونة من : جريددر ورصاصة ترابية ووايت ماء .
- 4 فرق مكونة من : جريددر فقط .
- فرقة نظافة العبارات والوديات والمجاري المائية : لودر وجي سي بي وحفار كبير اذا لزم الامر وعمال عدد 3 مع الادوات اللازمة من كريكات وما الى ذلك وتكون وظيفتهم العمل على تنظيف العبارات واخاديد الطرق والقنوات المفتوحة وازالة الزيوت والملوثات الاخرى من المعترضات واحواض الموازنة وازالة المخلفات والتراكمات الرملية من القنوات والجدران الامامية للعبارات وصيانة واختبار الصمامات والمضخات ومحطات الضخ.
- فرقة صيانة ونظافة اللوحات التحذيرية والارشادية: وايت ماء وعمال عدد 2 ولودر وعدد (مفكات وصواميل ومقياس عاكسية).
- فرقة صيانة الاصول الجيوتقنية مكونة من مشرف وبوكلين وعمال عدد 3 وكمبرسر هواء مع جميع المواد والعدد اللازمة لتنظيف الانهيارات وعدم دخول الصخور الى مسار الطريق وجميع ما يلزم لتثبيت الصخور والعناصر الجيوتقنية من مصارف افقية وجابيون.
- فرق صيانة السياج إن وجدت
- فرقة صيانة الحواجز المعدنية إن وجدت.
- يتم التنسيق بين المشرفين ومتابعة اعمالهم ومدى التزامهم بالبرامج بواسطة مدير المشروع.



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

- يكون مدير المشروع وبمساعدة المشرفين مسؤولاً عن ارشفة تقارير واعمال الصيانة العادية في نظام ادارة الوثائق الالكترونية
- يتم التحقق من جودة الاعمال المنفذة بواسطة مهندس ضبط الجودة .
- يتم مراقبة اعمال السلامة في جميع اعمال الفرق السابقة بواسطة مهندس المشروع.

الطاقم الفني للمشروع:

م	الوظيفة	الاسم
1	مدير المشروع	عمار علي محمد حسين
2	المشرف علي العمال في الفرقة الاولى والثانية	سعد بن سالم بن راشد الدوسري
3	المشرف علي العمال في الفرقة الثالثة والرابعة	سويد بن راشد بن مفلح الدوسري
4	المشرف علي العمال في الفرقة الخامسة والسادسة	عبدالله سعد بن عبدالله القحطاني
5	المشرف علي العمال في الفرقة السابعة والثامنة	سالم عبدالله بن سالم الدنياوي
6	المشرف علي العمال في الفرقة التاسعة والعاشره والحادية عشر	صالح دعيكان بن ناصر المري

مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

آلية ونظام تنفيذ الصيانة العادية:

يتم تقسيم المشروع لخمس فرق صيانة يتم تعيين مشرف او مراقب لكل فرقتين حسب الجدول الموضح
ويتم تكرار توزيع دوريات المراقبة والمخلفات على الطرق كمايلي :

م	اسم الطريق	الطول (كم)	تكرار سيارات المخلفات	تكرار عمليات التفتيش
1	طريق الطراق	18	مرة في الشهر	مرة شهريا
2	طريق القرية السفلي	16	مرة في الشهر	مرة شهريا
3	طريق الرياضيات	29	مرة في الشهر	مرة شهريا
4	طريق القرو	18.3	مرة في الشهر	مرة شهريا
5	طريق العطيشانية	65.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
6	طريق الحساء	83	مرة في الشهر	مرة شهريا
7	طريق الضغط الكهربائي (الجنوبي)	17.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
8	طريق المطار امتداد طريق ام ربيع	44.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
9	طريق مطلة	32.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
10	طريق الحرازية	32.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
11	طريق الوريعة (الظهرة)	13.5	مرة في الشهر	مرة شهريا



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

12	طريق ام غوير	7	مرة في الشهر	مرة شهريا
13	طريق الطراز الغربي	25	مرة في الشهر	مرة شهريا
14	طريق الاشيعل	9.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
15	طريق الشاذلية المتجه من قرية العليا جنوبا لظهرة الحساء	40	مرة في الشهر	مرة شهريا
16	طريق مورد الخالدية الي مركز ام عقلا	57	مرة في الشهر	مرة شهريا
17	طريق ام عقلا الي العمانية	14	مرة في الشهر	مرة شهريا
18	طريق الأبراج الذي يربط طريق الرعية/رماح بطريق النعيرية/جودة	139	مرة في الشهر	مرة شهريا
19	من مركز مناخ حتي القيصومة	35	مرة في الشهر	مرة شهريا
20	من مركز ام قليب حتي حفر الباطن	28	مرة في الشهر	مرة شهريا
21	ربط هجرة البرازيطريق الحفر الباطن/رفحاء (85) وحتى خزان البوشية	15	مرة في الشهر	مرة شهريا
22	من السعيرة وحتى مفرق ابرق الكبير	41	مرة في الشهر	مرة شهريا
23	مزرعة/ محمد إبراهيم القروص	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
24	مزرعة قصبي احمد ال موسى	0.7	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

25	مزرعة علي المغاسلة	10	مرة في الشهر	مرة شهريا
26	مزرعة حسن الشهري	2.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
27	مزرعة ماضي عسكر الهاجري	0.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
28	طريق الخن يبرين	3.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
29	مزرعة رمضان قاعد العنزي	2.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
30	مزرعة محمد ظافر الشهري	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
31	مزرعة اياد محمد الابيض	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
32	مزرعة احمد حامد الغامدي	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
33	مزرعة علي بدر المهاشير	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
34	مزرعة علي محمد المري	15	مرة في الشهر	مرة شهريا
35	مزرعة ناصر عبدالله ال يوسف	4.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
36	مزرعة سعيد عبدالله الغامدي	6.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
37	مزرعة حسين علي ال الشيخ حسين	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
38	مزرعة سلمان احمد براك	1.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
39	مزرعة ناجي راضي ال حرز - مزرعة فهيم سعد الغنام	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
40	مزرعة محمد عبدالله الخالدي	3.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
41	مزرعة عبدالعلي عيسي المنشاد	0.8	مرة في الشهر	مرة شهريا



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

42	مزرعة سعود عبدالعزيز الزعبي	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
43	مزرعة إبراهيم علي العوامي	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
44	مزرعة علي احمد المرهون	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
45	مزرعة فهد ناصر الهاجري	2.1	مرة في الشهر	مرة شهريا
46	مزرعة فهد راشد الدهان	6	مرة في الشهر	مرة شهريا
47	مزرعة مريم عبدالله مويس	4	مرة في الشهر	مرة شهريا
48	مزرعة توفيق حسن فتيل	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
49	مجموعة مزارعين/ عنهم ابراهيم العماري (المعترض طريق سكة الحديد)	7	مرة في الشهر	مرة شهريا
50	هجرة محفورة	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
51	مزرعة / سالم عياد المطيري	9	مرة في الشهر	مرة شهريا
52	مزرعة / دخيل مطلق طامي المطيري	11	مرة في الشهر	مرة شهريا
53	مزرعة / دغيم عليان ساجر المطيري	9	مرة في الشهر	مرة شهريا
54	مزرعة / عبد الرحمن عبد الله التركي	7	مرة في الشهر	مرة شهريا
55	مزرعة / محمد بن بدر الدويش	5	مرة في الشهر	مرة شهريا
56	مزرعة / فلاح نهار العجمي	7	مرة في الشهر	مرة شهريا
57	مزرعة / متعب عبيد الميموني المطيري	6	مرة في الشهر	مرة شهريا
58	مزرعة / راشد حمد محمد المري	3	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

59	مزرعة / محمد بغير جابر المري	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
60	هجرة / ذعبلوتن محمد صالح الراشدي	500	مرة في الشهر	مرة شهريا
61	مزرعة / عبد الله فهد عبد الله المري	20	مرة في الشهر	مرة شهريا
62	مزرعة / فؤاد عيسى الدوسري	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
63	مزرعة / صالح مسفر ال حيدر	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
64	مزرعة / محمد احمد ابو قرصين	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
65	مزرعة / وليد فهد عبد الله اباحسين	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
66	مزرعة / بدر عبد الله السهلي	1.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
67	مزرعة / عبد الله حبيب ال عيد	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
68	مزرعة / منصور جمعان الزهراني	3.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
69	مزرعة / مهدي عباس احمد	0.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
70	مزرعة / صابر محمد ال غرامة الوكيل / سعيد محمد عبد الله الدخيل	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
71	مزرعة / مني علي حسين العشوي	2.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
72	مزرعة / حسين عبد الجليل ال حمزة	5.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
73	مزرعة / جار الله محمد الزهراني	2.3	مرة في الشهر	مرة شهريا
74	مزرعة / عمر غالب الدرويش	3	مرة في الشهر	مرة شهريا



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

75	مزرعة / رامي احمد كمال الوكيل / عبد الرحيم عبد الكريم ال احمد	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
76	مزرعة / حبيب محمد رمضان	6	مرة في الشهر	مرة شهريا
77	مزارع / شمة راشد الدوسري ومبارك راشد الدوسري ومحمد مرشد الدوسري	0.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
78	مزرعة / عادل عبد الله ال هندر	4	مرة في الشهر	مرة شهريا
79	مزرعة / محمد عبد الله المطيري	17	مرة في الشهر	مرة شهريا
80	مزارع غرب المطار / الوكيل عن المزارعين ماجد سعيد الشاخوري	4	مرة في الشهر	مرة شهريا
81	مزرعة / عبد الله صالح الدرويش	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
82	مزرعة / خالد ابراهيم العجلان الوكيل / عبد السلام باقر المطاوعة	0.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
83	مزرعة حسين عبدالله الشغل	0.75	مرة في الشهر	مرة شهريا
84	مزرعة ابراهيم سلامة الحربي	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
85	مزرعة محمد مغرم علي الغامدي	1.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
86	مزرعة فوزية سليمان المحيسن الوكيل / خالد سند الدوسري	0.4	مرة في الشهر	مرة شهريا
87	مزرعة ثامر منصور المطرودي	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

88	مزرعة عبدالله ماجد الدويش	9.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
89	مبارك احمد الصافي الغامدي	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
90	مزرعة فرحان فالح الزعبي	7.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
91	مزرعة معجب حمود العتيبي	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
92	مزرعة فهد ناصر الجاسم الرويحي	0.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
93	مزرعة صباح عبدالعزيز الزامل	1.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
94	مزرعة جميل صالح ال زريع	1.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
95	مزرعة محمد صالح المري	2.3	مرة في الشهر	مرة شهريا
96	مزرعة حمد ابراهيم الخلف	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
97	مزرعة ترك محمد صالح الملافخ الوكيل / حسن عبدالله الحسن	0.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
98	مزرعة مرعي حيدر مرعي القحطاني	5	مرة في الشهر	مرة شهريا
99	مزرعة محمد عبدالله ال حماد	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
100	مزرعة صالح محمد حمد المري	9	مرة في الشهر	مرة شهريا
101	مزرعة الأميرة / مشاعل بنت فهد بن جلوي ال سعود	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
102	مزرعة صادق عبد رب الرضا	0.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
103	مزرعة معيض سعيد القحطاني	0.8	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

104	مزرعة علي محمد حمدان العمري	1.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
105	مزرعة عمران علي عبدالله ال سعيد	1.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
106	مزرعة عبدالله غنام الخالدي	5	مرة في الشهر	مرة شهريا
107	مزرعة نايف محمد الخالدي وماجد ناصر العاصمي	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
108	أهالي مركز مشدوبة (تركي بن غزاي صمير)	25	مرة في الشهر	مرة شهريا
109	مزرعة محمد منصور الدوسري	0.3	مرة في الشهر	مرة شهريا
110	مزرعة سلطان شايح سعود الضويحي	25	مرة في الشهر	مرة شهريا
111	مزرعة خالد فهد مبارك الدوسري	1.3	مرة في الشهر	مرة شهريا
112	مزرعة فؤاد عيسي جاسم الدوسري	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
113	مجموعة مزارعين/ عنهم سعد ماجد السديري	4	مرة في الشهر	مرة شهريا
114	بدر عبدالله رذن السهلي . مجموعة مزارعين عنهم مهدي عباس احمد الطريق الرابط بين M و M2 (طريق البقالة)	5	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

115	خليفة محمد الشايب و محمد صالح العواد	0.3	مرة في الشهر	مرة شهريا
116	مزرعة رجاء صالح بالحارث	5	مرة في الشهر	مرة شهريا
117	مزرعة احمد علي الخلف . عنه الوكيل / عبدالله مهدي ال فردان	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
118	مزرعة سالم عايض منير العتيبي	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
119	سعود عبدالرحيم الفرج ، شاكرا علي الفرج ، ناصر حسن الجاروف	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
120	مزرعة منذر يوسف الغزال	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
121	طريق الشملول القديم بجانب الناصرية	15	مرة في الشهر	مرة شهريا
122	علياء احمد محمد الدوسري ، الوكيل محمد حمد العماري	6	مرة في الشهر	مرة شهريا
123	خليفة محمد الدوسري ، الوكيل / خالد خليفة الدوسري	1.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
124	محمد القحطاني	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
125	فهد سعد المطيري	7	مرة في الشهر	مرة شهريا
126	علوش ناصر العجمي	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
127	نمر بن خالد الراشد	0.7	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

128	فهد بن سعود بن جفين العجمي	10	مرة في الشهر	مرة شهريا
129	خالد سعيد خميس الدوسري ، الوكيل خالد خليفة الدوسري	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
130	مجموعة مزارعين / عنهم احمد عوض القحطاني	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
131	ناصر عبد الله النمشان	2.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
132	وصلة طريق ام قليب - حفر الباطن	30	مرة في الشهر	مرة شهريا
133	وصلة طريق مركز الفاو - الذبيبة	8	مرة في الشهر	مرة شهريا
134	الطريق 1 بمركز مليحة	8.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
135	الطريق 2 بمركز مليحة	0.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
136	الطريق 3 بمركز مليحة	2.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
137	الطريق 4 بمركز مليحة	2.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
138	الطريق 5 بمركز مليحة	2.95	مرة في الشهر	مرة شهريا
139	الطريق 6 بمركز مليحة	4.85	مرة في الشهر	مرة شهريا
140	الطريق 7 بمركز مليحة	1.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
141	الطريق 8 بمركز مليحة	3.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
142	الطريق 9 بمركز مليحة	3.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
143	الطريق 10 بمركز مليحة	2.4	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

144	الطريق 11 بمركز مليحة	2.1	مرة في الشهر	مرة شهريا
145	الطريق 12 بمركز مليحة	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
146	الطريق 13 بمركز مليحة	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
147	طريق مزرعة جلوي بن ناصر العجمي	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
148	طريق مزرعة محمد احمد المسيعيد	1.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
149	طريق مزرعة مطلق بن عبدالله الدويش	3.1	مرة في الشهر	مرة شهريا
150	طريق مزرعة نشا عايش فضاء البقمي	13	مرة في الشهر	مرة شهريا
151	نذير عبدالواحد الحيدر	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
152	علي سالم ال موسي	3.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
153	سعد ابراهيم العبد القادر	3.4	مرة في الشهر	مرة شهريا
154	رباح سعيد ال ضاحي	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
155	عبد الجليل احمد ال حمزة	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
156	حسين عبد الحميد المرهون	1.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
157	الهام حسن الصغير	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
158	ناصر عبدالله الدوسري	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
159	داوود سليمان المبيض	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
160	سلطان علوش السهلي	1.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
161	عبد الرحمن المعيصب	4	مرة في الشهر	مرة شهريا



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

162	ماجد ناصر الهاجري	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
163	براك سلطان الخالدي	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
164	مرتضي ال مرهون ومحمد وهب العلي	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
165	قاسم ابراهيم الشقاق	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
166	حجي حسين الجبران	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
167	صالح معتوق ال محمد علي	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
168	عبدالله معتوق القديحي	0.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
169	محمد ناصر بن شافي	5	مرة في الشهر	مرة شهريا
170	نايف مدرهم الكثيري	16	مرة في الشهر	مرة شهريا
171	محمد احمد المسيعيد	1.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
172	مطلق عبدالله الدويش	3.1	مرة في الشهر	مرة شهريا
173	طريق هجرة السفانية	1.3	مرة في الشهر	مرة شهريا
174	عبدالله عيسي	1.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
175	خليفة الدوسري	3.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
176	علوي بن صالح ال كاظم	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
177	احمد علي عبدالله ال خلف	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
178	يوسف محسن احبيل	3.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
179	عبدالرزاق عبدالرحمن المعيصب	4	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

180	عادل مقبل الذكير	4	مرة في الشهر	مرة شهريا
181	عبدالرحمن عبدالله الرميزان	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
182	ابوسالم اليامي	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
183	خالد الخميس	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
184	عبدالله الماجد	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
185	ماجد سعيد الشاخوري	11	مرة في الشهر	مرة شهريا
186	عبد الله عبد الوهاب عبداللطيف الصالح	3.6	مرة في الشهر	مرة شهريا
187	احمد يحيى الحكمي	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
188	خالد الزهراني	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
189	سمير حمد الرشيد	4	مرة في الشهر	مرة شهريا
190	هند عدنان الزبيدي	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
191	عبد اللطيف صالح الحمد	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
192	نايف لاحم الخالدي	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
193	فيصل احمد المنصور	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
194	احمد محمد الغامدي	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
195	جاسم محمد زاهري	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
196	عبد الجليل حمزة ال عاشور	0.8	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

197	علي تركي ال هلال	0.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
198	عبدالمنعم تركي ال هلال	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
199	جعفر اسماعيل ال منصور	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
200	جاسم علي الثواب	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
201	محمد علي الثواب	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
202	حسين علي الثواب	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
203	علي جعفر ال فردان	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
204	نادر عبد الواحد الحيدر	1.3	مرة في الشهر	مرة شهريا
205	جبر يوسف الرميحي	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
206	عبد الرزاق عبدالله عبدالرحمن الدليجان	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
207	علي بن عايض العجمي	5	مرة في الشهر	مرة شهريا
208	عبدالله ابراهيم الهلالي	0.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
209	عباس علي القروص	5	مرة في الشهر	مرة شهريا
210	يحيى حكيم وكيل عنه عبدالله عصيص	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
211	عبدالله علي عبدالله الخنيزي	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
212	علي عبدالله علي الخنيزي	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
213	علي سالم الغامدي	1.2	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

214	خالد علي ال جبر	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
215	علي محمد العمري 2	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
216	حبيب علي القروص	5	مرة في الشهر	مرة شهريا
217	زهراء عبدالكريم ال غريب	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
218	مرعي حيدر ال دواس القحطاني	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
219	حسين محمد الهبوب	1.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
220	مانع ناصر المانع	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
221	عمران السعدي	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
222	حسين عيسي ال امان	0.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
223	سعد مسمار القحطاني	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
224	احمد محمد العليوي	0.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
225	علي حسين ال امان	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
226	قاسم الشقاق	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
227	مرتضي الجميعان	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
228	محمد نايف	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
229	صلاح حمد الرشيد	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
230	هويج حسن القحطاني	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
231	محمد نايف 2	1	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

232	عبدالله حبيب العيد	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
233	ماجد ناصر القحطاني	1.2	مرة في الشهر	مرة شهريا
234	يوسف احمد العثمان	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
235	محمد حمود السهدي الهاجري	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
236	سليمان حمد علي الحمد	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
237	ابراهيم حمد علي الحمد	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
238	سالم عبدالله علي البلم	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
239	طريق القرابين	20	مرة في الشهر	مرة شهريا
240	طريق الشهامة	3.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
241	طريق هجرة الذيايبة	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
242	طريق هجرة عجائب	100	مرة في الشهر	مرة شهريا
243	محمد علي النمر	0.7	مرة في الشهر	مرة شهريا
244	سعيد رداد الزهراني	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
245	خالد مبارك القحطاني	0.25	مرة في الشهر	مرة شهريا
246	خريفة سعيد الطبعي	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
247	مرتضي عبد الحميد المرهون	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
248	محمد بن وهب مك العالي	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
249	سعيد حبيب المغاسلة	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

250	مني سعيد القرني	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
251	سعيد سلمان المهدي ورفقاه	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
252	عبدالرحمن المعيصب	2.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
253	صالح علي المري	0.9	مرة في الشهر	مرة شهريا
254	محمد سعيد القسيم	0.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
255	طاهر ابراهيم الهاشم	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
256	خالد خليفة الدوسري	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
257	شيخة سعد ال حسين	0.4	مرة في الشهر	مرة شهريا
258	ماجد ناصر الهاجري ورفقاه	7	مرة في الشهر	مرة شهريا
259	مجموعة مزارعين / عنهم / احمد عوض القحطاني	7.5	مرة في الشهر	مرة شهريا
260	منصور محمد حيان	1	مرة في الشهر	مرة شهريا
261	عبدالله حمد العايزي	2	مرة في الشهر	مرة شهريا
262	أهالي هجرة عردة / عنهم : غانم سعد العقاري	150	مرة في الشهر	مرة شهريا
263	طريق أهالي مركز الحرياء	14.8	مرة في الشهر	مرة شهريا
264	سفر مبارك الشهري	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
265	داهم بتال القحطاني	1.5	مرة في الشهر	مرة شهريا





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

266	محمد حمود الهاجري	3	مرة في الشهر	مرة شهريا
267	خالد إبراهيم الفلاج	3	مرة في الشهر	مرة شهريا

- بخصوص جولات التفتيش على الاصول ستم من قبل الكادر الفني (مدير المشروع - المراقبين) وسيتم اختيار الكادر الفني بعناية بحيث يكون لدى أعضائه الخبرة الفنية الكافية في اعمال انشاء وصيانة الطرق.

- سيارة المخلفات ستكون عبارة عن قلاب 3 م 3 مع عامل وسائق وسيتم الحرص على رمي المخلفات في الاماكن المخصصة لذلك.

- سيتم تزويد كل من المفتشين (المراقبين) بأجهزة الاتصال المناسبة واجهزة التقاط البيانات (اياد موصول بالانترنت مع تثبيت جميع البرامج والانظمة التي سيتم العمل بها مثل نظام ادارة صيانة الطرق ونظام المعلومات الجغرافية..) وسيتم رفع الملاحظات والعيوب على هذه الاجهزة مباشرة الى مدير المشروع وحيث سيتم تصنيفها على انها عيوب اولية (تستدعي الحصول على امر عمل) او ثانوية (يتم العمل على تلافيها بأسرع وقت ممكن) وعلى ان يكون لممثل الجهة الصلاحية الكاملة في الوصول الى هذه البيانات والمعلومات.





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

- لتسجيل المسار ويتم منح الصلاحية الكاملة لممثل الجهة لمتابعة تحركاتها.
- يتم توثيق جميع الاعمال والملاحظات الناتجة عن الجولات التفتيشية في نظام ادارة صيانة الطرق من قبل مدير المشروع .
- سيتم استخدام جهاز ايكونيكس لأرشفة البيانات وجهاز ماكسيمو لادارة الأصول.


عمليات الصيانة العادية:

- سيتم تقسيم المشروع الى 5 فرق ويتم تعيين مشرف ويكون مسؤولا عن جميع اعمال الصيانة العادية فيها وعن تطبيق خطة الصيانة العادية وتتم عمليات الصيانة العادية كما يلي :





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

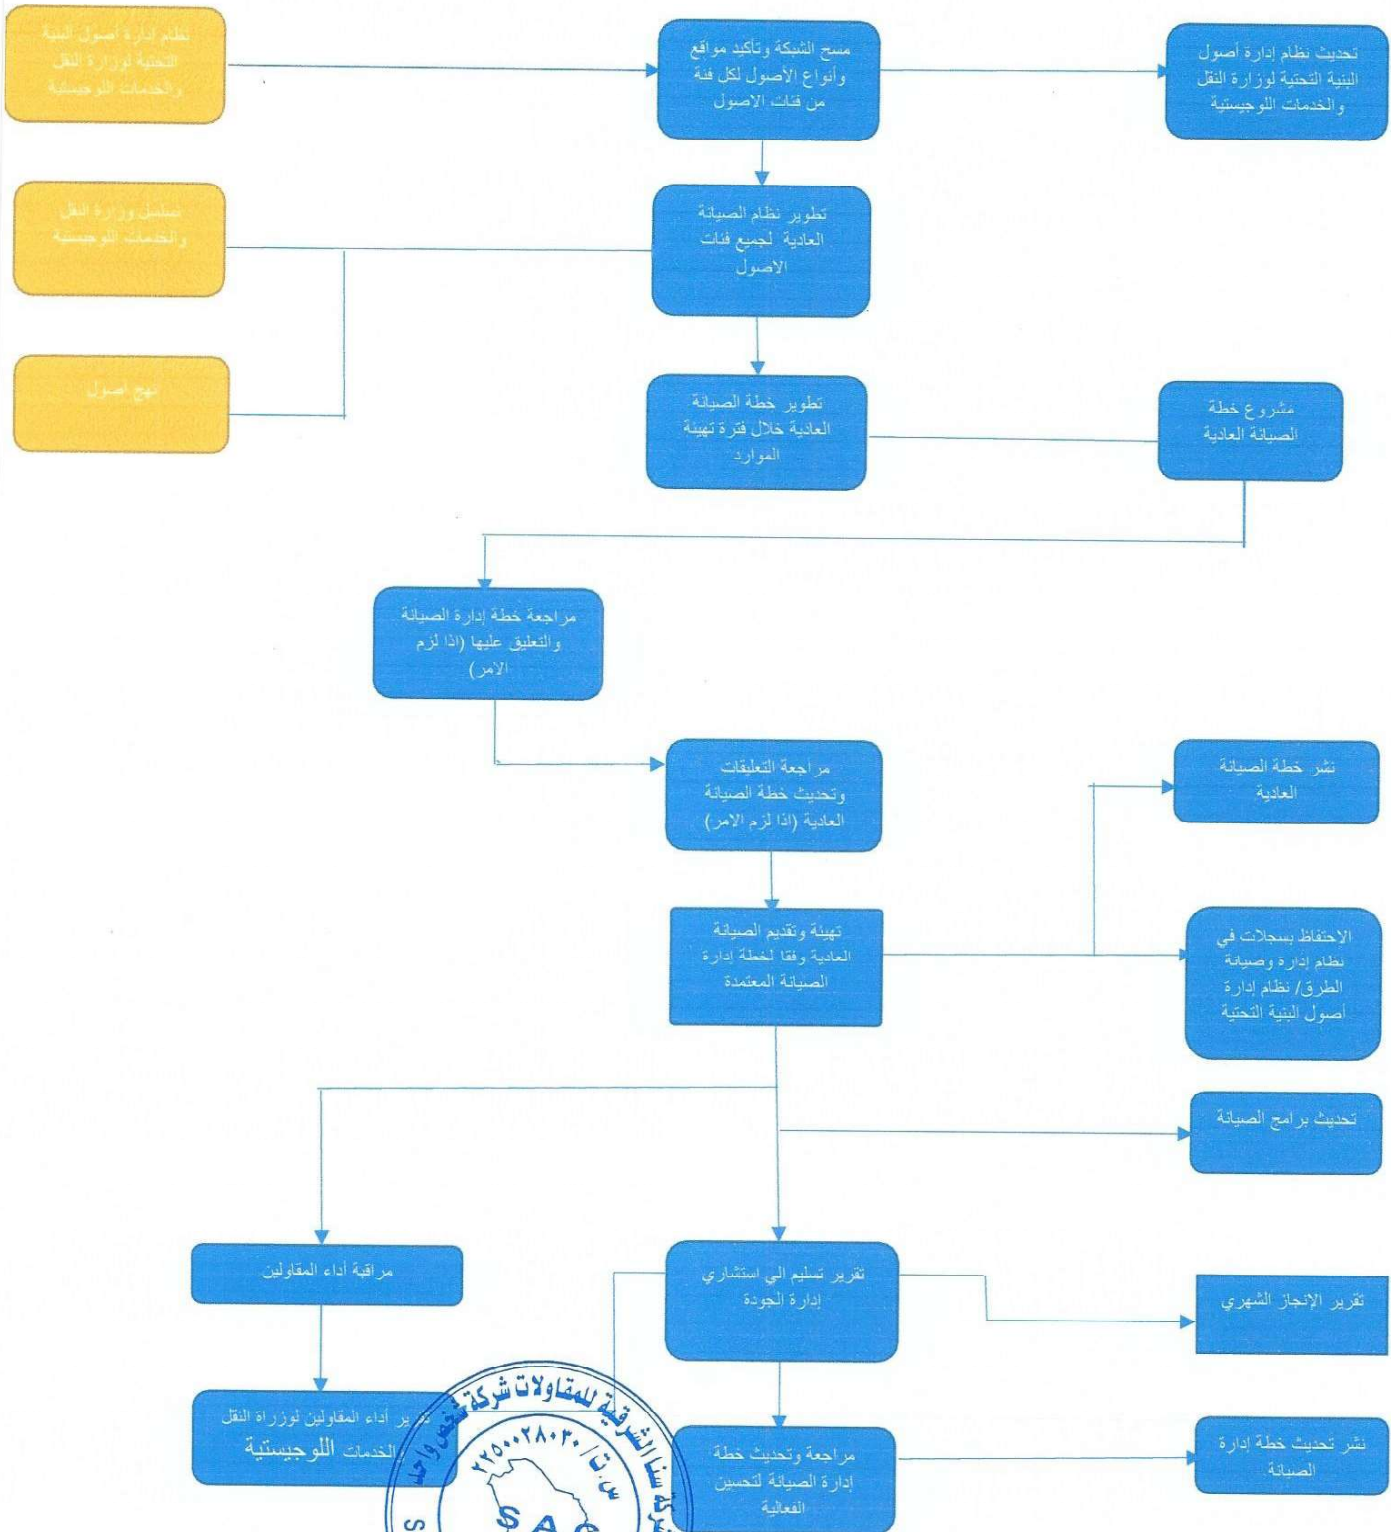



مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

يتم وضع برنامج الصيانة العادية من قبل مدير المشروع ويتم اعتماده من قبل ممثل الجهة.

- سيتم متابعة تنفيذ خطة وبرنامج الصيانة العادية من قبل مدير المشروع ويتم توثيق جميع الاعمال في نظام ادارة صيانة الطرق من قبله.
- يتم التأكد من امتثال المواد وضبط الجودة في جميع اعمال الصيانة العادية من قبل مدير ضبط الجودة.
- يكون مدير المشروع مسؤولاً عن توزيع الموارد بين الفرق وحسب الخطة والحاجة ويكون مسؤولاً عن طلب موارد اضافية من المدير التجاري او مدير المشروع لتحقيق درجة الاداء المطلوبة.
- يتم العمل على المحافظة على مؤشرات الأداء المطلوبة للصيانة العادية.
- يتم التنسيق بين المشرفين ومتابعة اعمالهم ومدى التزامهم
- يكون مدير المشروع وبمساعدة المشرفين مسؤولاً عن ارشفة تقارير واعمال الصيانة العادية.
- يتم التحقق من جودة الاعمال المنفذة بواسطة مهندس ضبط الجودة.





مشروع فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

صيانة وتشغيل مواقع الفرق:

سيتم توفير خدمات التشغيل والصيانة لمواقع الفرق وتوفير عدد 1 حارس لتولي خدمات الحراسة والنظافة وستتم الحفاظ على نظافة هذه الفرق وصيانتها وفق ما ذكر بالموصفات كما سيتم تركيب لوحة ارشادية مقابل كل مقر من مقار فرق الصيانة ويكتب عليها كما ذكر في المواصفات.



عقد (التشغيل والصيانة)

اسم المشروع: فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية

رقم العقد: (1017523)

تاريخ توقيع العقد: ١٤٤٥ / ٣ / ١٣



يوليو ٢٠٢٣ م

1 من 91



٢ وثائق العقد

أولاً: يتكون العقد من الوثائق التالية:

- أ. وثيقة العقد الأساسية.
- ب. شروط العقد.
- ج. الشروط المالية.
- د. نطاق العمل المفصل.
- هـ. الشروط المفصلة.
- و. المواصفات الخاصة.
- ز. الرسومات والمخططات.
- ح. خطاب الترسية [٩٢١٩] وتاريخ [١٤٤٥/٠٢/١٢].
- ط. الملحقات.
- ي. العرض المقدم من المتعاقد [] و [] إجابة على منافسة [٢٣٠١٣٩٨٧٠١٧١].
- ك. أي وثائق أخرى يجري الاتفاق على إلحاقها بهذا العقد كتابة.

ثانياً: تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة فيها جزءاً لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتم بعضها بعضاً، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة أولاً من هذا البند.

ثالثاً: في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص العقد وبين أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تكون أحكام النظام ولوائحه هي الواجب تطبيقها.

٣ الغرض من العقد

يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتنفيذ [فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية] وفقاً للشروط والمواصفات ووثائق العقد المبينة في البند رقم (٢) من هذا العقد.

٤ قيمة العقد

أولاً: القيمة الإجمالية للعقد هي مبلغ قدره [٤٩,٧٨٤,٨٨٠] تسعة وأربعون مليون وسبعمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي شاملة القيمة المضافة (١٥ %)، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

ثانياً: تخضع القيمة الإجمالية المشار إليها سلفاً للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي ينفذها المتعاقد طبقاً لهذا العقد ووفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

٥ مدة العقد

يتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مدة [ثلاث سنوات ميلادية] ابتداء من تاريخ [محضر تسليم الموقع].



٦ النظام الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ هـ ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم (١٢٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢١ هـ المعللة بالقرار الوزاري (٣٤٧٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١١ هـ وكل تعديل أو نظام أو لائحة تحل محلها.

كما يخضع العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.

٧ حسم النزاعات

مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأي نظام مطبق أو ذي صلة، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتصل به، تختص المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.

٨ نسخ العقد

تم تحرير وتوقيع [١] نسخ من هذا العقد: نسخة للمتعاقد، ونسخة إلكترونية للإدارة المعنية بالإشراف على التنفيذ، ونسخة إلكترونية للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة إلكترونية للديوان العام للمحاسبة، ونسخة إلكترونية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق ونسخة إلكترونية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية،

٩ التوقيع

وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد لـ [فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة الشرقية].



الطرف الأول: وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الطرف الثاني: [شركة سنا الشرقية للمقاولات]

الاسم: بدر بن عبدالله الدلامي

الصفة: نائب المدير لشؤون الطرق

التوقيع: 

الاسم: د. عيسى بن ناصر بن حرب المري

الصفة: المدير العام

التوقيع: 
